



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
ALCALDE MUNICIPAL DEL G.A.M.CH.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS





**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

**GESTIÓN: T. S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**



QAQACHACA

SANEAMIENTO BÁSICO

NOMBRE	MONTO	FINANCIAMIENTO	DISTRITO	ESTADO
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE JANCUYO CULTA	62.792,47	G.A.M.CH.: 100%	CULTA	CONCLUIDO
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CHALLAPAMPA NORTE CONDO	47.839,35		NORTE CONDO	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARINACOTA	109.223,78		QAQACHACA	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CH'ITAHUYO IRUNSATA	149.428,46		QAQACHACA	



NORTE CONDO



CULTA





**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

**GESTIÓN: T. S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**



CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS

NOMBRE	MONTO	FINANCIAMIENTO	DISTRITO	ESTADO
MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO COMUNIDAD JANKOAQUE CHALLAPATA (ADQUISICION DE MATERIALES)	88.183,85	G.A.M.CH.: 100%	CHALLAPATA	CONCLUID O
IMPLEMENTACION DE DEFENSIVOS RIO ANCACATO (MAQUINARIA Y EQUIPO)	9.762,00		ANCACATO	CONCLUID O
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TANQUE DE MICRO RIEGO PATACUYO - ANCACATO	42.484,00		ANCACATO	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE MICRORIEGO IRUMA CATARIRI (ADQUISICION DE MATERIALES)	28.215,52		ANCACATO	CONCLUID O
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DE COMUNIDAD UYUNI	6.259,10		AGUAS CALIENTES	CONCLUID O

CHALLAPATA



ANCACATO





**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

**GESTIÓN: T. S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**



GESTION DE CAMINOS

NOMBRE	MONTO	FINANCIAMIENTO	DISTRITO	ESTADO
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL COMUNIDAD SACARI CHALLAPATA	90.110,00	G.A.M.CH.: 100%	CHALLAPATA	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES CHALLAPATA	176.187,00		CHALLAPATA (MOTONIVELADORA)	
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL COMUNIDAD MACALLU CHALLAPATA	90.110,00		CHALLAPATA	
CONTRAPARTE DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DISTRITO HUANCANÉ	8.109,20		HUANCANE	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DISTRITO HUANCANE	25.750,00		HUANCANE	
CONST. ENLOSETADO AV. CHAYANTA /CALLE POTOSI/ SIMON BOLIVAR (CULTA)	216.027,19		CULTA	
CONST. PUENTE VEHICULAR RIO CHANGARA Y LA BANDERA	161.872.43		CHALLAPATA	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES QAQACHACA (TRAMO CHAKERI) QAQACHACA	43.091,62		QAQACHACA	

HUANCANE



CULTA




QAQACHACA



CHALLAPATA

**OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA
Distancia total 82.6 Kilometro**

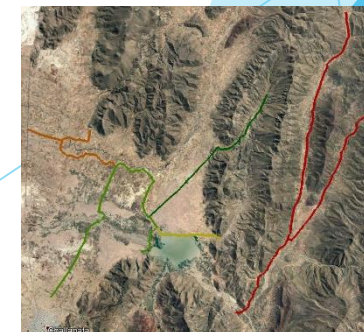



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**



ANCACATO

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

NOMBRE	MONTO	FINANCIAMIENTO	DISTRITO	ESTADO
ADQUISICION DE MATERIALES MURO PERIMETRAL U.E. HUCHUSUMA PORVENIR	16.662,00	G.A.M.CH.: 100%	CHALLAPATA	CONCLUIDO
CONSTRUCCION CASA ARTESANAL LACA VINTO - OBRA FINA	114.761,37		CULTA	CONCLUIDO
MANTENIMIENO CENTRO DE SALUD POBLACION CRUCE CULTA	42,453,82		CULTA	CONCLUIDO
ACORDONAMIENTO U.E. BOLIVIA - SIMON BOLIVAR - CULTA	48.685,53		CULTA	EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN BATERIA DE BAÑOS UNIDAD EDUCATIVA CATAVICOLLO	45.565,45		NORTE CONDO	CONCLUIDO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO U.E. GERMAN BUCH	8.284,68		ANCACATO	CONCLUIDO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO U.E. HUANCARANI BUENA VISTA)	6.867,20		ANCACATO	CONCLUIDO
MEJORAMIENTO CERCO PERIMETRAL U. E. CRUCE AGUAS CALIENTES	7.692,94		AGUAS CALIENTES	CONCLUIDO
COMPRA Y COLOCADO DE PUERTAS Y GARAJE EN U. E. TOLAPALCA	8.050,00		TOLAPALCA	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19	2.548,50		CHALLAPATA	CONCLUIDO
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	26.900,00		CHALLAPATA	CONCLUIDO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ACTIVIDAD Y REFACCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PARCO - QAQACHACA	19.094,80		QAQACHACA	CONCLUIDO



CHALLAPATA



TOLAPALCA





**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

**PROYECTO: “AMPLIACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN C. S. SUMAJ CAUSAYPAJ
CHALLAPATA”**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO A EJECUTAR	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
94.700,33	94.700,33	0.00	100,00	100,00	55 D. C.	35 D. C.



OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA.




**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

PROYECTO: “AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD SUMAJ CAUSAYPAJ CHALLAPATA”

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO A EJECUTAR	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
999,666.86	999,666.86	0.00	100,00	100,00	40 D. C.	40 D. C.

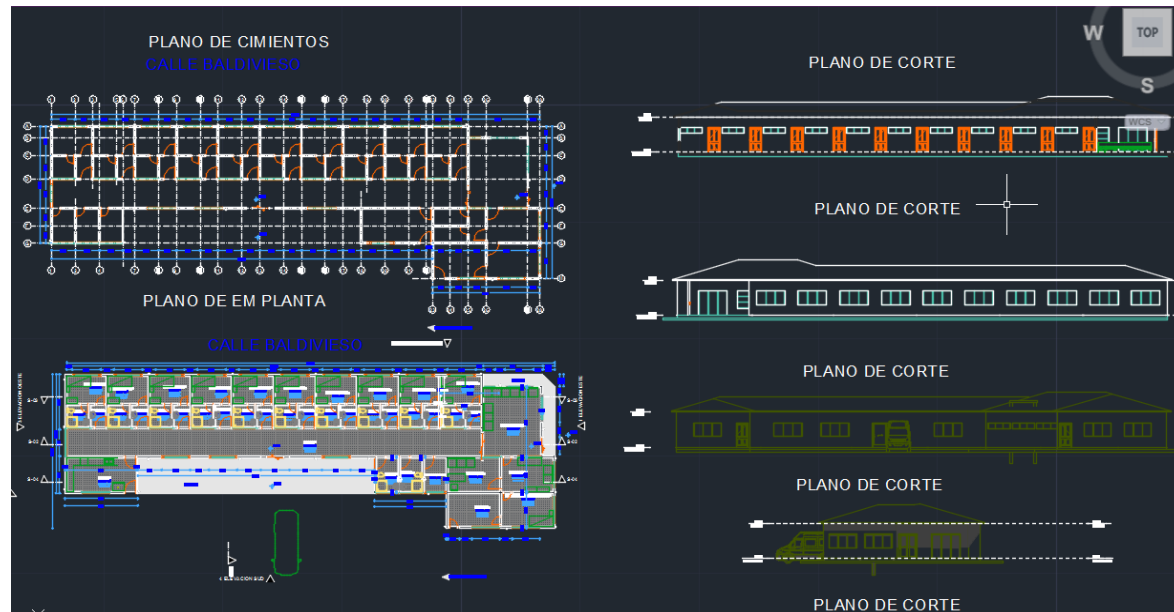

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO





**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

**PROYECTO: “CONST. PRADO AV. L. CABRERA ENTRE CBBA Y 9 DE ABRIL CHALLAPATA”
(SUPERVISOR: Arq. FRANZ QUISPIA FLORES)**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO A EJECUTAR	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
730.000,00	174.017,75	555.982,25	23.84 %	100 %	220	220

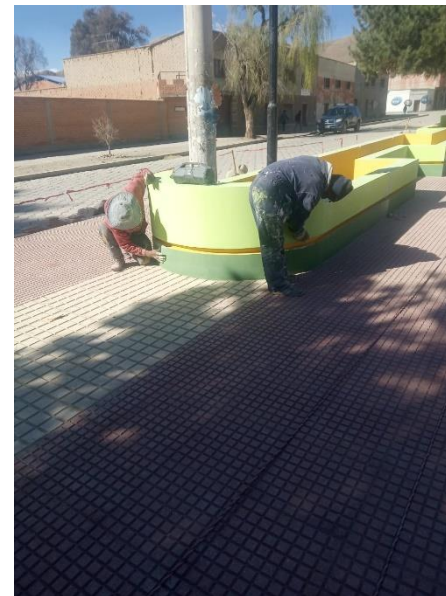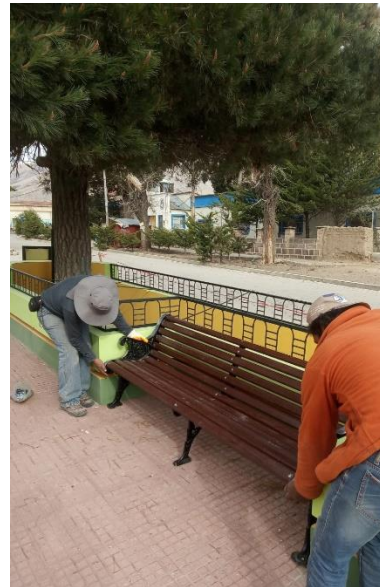

OBSERVACIONES: PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION FINANCIERA



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

**PROYECTO: “CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL CRUCE CULTA - CHALLAPATA”
SUPERVISOR: FERNANDO AJHUACHO DOMINGUEZ**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
4.616.138,83	2.597.750,66	56,28%	100,00%	350 D. C.	299 D.C.



OBSERVACIONES: EL PROYECTO CONCLUIDO



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

**PROYECTO: “CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA GRAL. JOSE BALLIVIAN Y SEGUROLA - CHALLAPATA”
SUPERVISOR: ING. EDWIN VILLARROEL**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
4.190.369,19	3.835.938,73	91,54%	100,00%	350 D. C.	309 D.C.



OBSERVACIONES: EL PROYECTO CONCLUIDO



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

**ACTIVIDAD: CONVENIO INTERGUBERNATIVO - “PERFORACION DE DOS POZOS EN LAS COM.
POQUERIRI Y TACAGUA - CHALLAPATA”**

COSTO TOTAL PROYECTO	CONTRAPARTE G.A.M.CH	CONTRAPARTE G.A.D. OROURO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
219.201,69	52.853,00	166.348,69	0,00 %	100,00 %	40 D. C.	40 D. C.



OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA



GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE RENDICION DE CUENTAS EN AUDIENCIA PUBLICA GESTION 2020

**PROYECTO: “TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE DEFENSIVOS EN MOVIMIENTO DE TIERRA
RIOS HUANCARANI - ANCACATO”
(TEC. SEGUIMIENTO: MARCELO ANCALLE CRISPIN)**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	CONTRAPARTE G.A.D. ORURO	CONTRAPARTE G.A.M.CH	SALDO A EJECUTAR	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO DE EJECUCION
110.604,40	90.025,60	20.578,80	0,00	100,00%	0,00%	25	25



OBSERVACIONES: Se construyo de 1600 metros lineales en movimiento de tierras (CONVENIO FINALIZADO)



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA



GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTIÓN 2020

PROYECTO : CONTRAPARTE ELECTRIFICACIÓN PROVINCIA AVAROA
FASE II
(ENCARGADO: JEHU CALANI PATZI)

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO A EJECUTAR	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
402.231,00	0,00	402,231,00	0%	20%



OBSERVACIONES: (NO SE HIZO EL DEPOSITO A FALTA DE RECURSOS EN LAS CUENTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL) EN EJECUCION



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

**PROYECTO: "SITEMA DE AGUA POTABLE QAQACHACA (CHALLAPATA)
CONVENIO FPS ORURO
(FISCAL: PRIMO ESPEJO COLQUE)**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO A EJECUTAR	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
2.452.936,32	2.341.040,53	111.895,79	95,44	100	370	370



OBSERVACIONES:.



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

**PROYECTO: “CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. SAN JUAN DE DIOS - U.E. ABAROA - U.E. ARGENTINA (CALLE ORTEGA ENTRE ORURO/AV. GERMAN BUSCH(CHALLAPATA))”

(FISCAL DE OBRA: ING. FERNANDO AJHUACHO)**

PRESUPUESTO PROGRAMADO S/CONVENIO	CONTRAPARTE FPS 100%	CONTRAPARTE GAMCH 0,0%	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
867.807,87	867.807,87	0.00	0.00	100%	85 D. C.	70 D.C.



OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE.



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**



**PROYECTO: "CONST. ENLOSETADO ACCESO U.E. RICARDO BENI MORO (CALLE BENEMERITOS
DE LA PATRIA ENTRE VILLARROEL/BENI)**

(FISCAL DE OBRA: ING. FERNANDO AJHUACHO)

PRESUPUESTO PROGRAMADO S/CONVENIO	CONTRAPARTE FPS 100%	CONTRAPARTE GAMCH 0,0%	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
3.320.276,07	3.320.276,07	0.00	0,00%	0,00%	CON CONVENIO



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**



**GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE
RENDICION DE CUENTAS FINAL EN AUDIENCIA PUBLICA
GESTION 2020**

PROYECTO: “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MOROCOYO”

PRESUPUESTO PROGRAMADO S/CONVENIO	CONTRAPARTE MMayA 70%	CONTRAPART E GADOR 0,0%	CONTRAPART E GAMCH 0,0%	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
930.611.38	744.489,10	93.061,14	93.061,14	0,00%	0,00%	CON CONVENIO

PROYECTO: “CONSTRUCCION RIEGO TECNIFICADO UMAMIAN (CHALLAPATA)”

PRESUPUESTO PROGRAMADO S/CONVENIO	CONTRAPARTE MMayA 70%	CONTRAPART E GADOR 0,0%	CONTRAPART E GAMCH 0,0%	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
3.821.403,95	2.674.982,77	573.210,59	573.210,59	0,00%	0,00%	CON CONVENIO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA



GESTIÓN: T.S. MARTIN FELICIANO CHOQUE RENDICION DE CUENTAS EN AUDIENCIA PUBLICA GESTION 2020

**PROYECTO: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO PAZUTA – COCHUYO (CULTA)”
(SUPERVISOR: ALVARO S. MARZE ADRIAN)**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO A EJECUTAR	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO
294.423,10	294.423,10	0,00	100	100	45 D. C.	45 D. C.



OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA



DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO URBANO INFORME FINAL DE ACTIVIDADES GESTION 2020

ENTREGA RESOLUCION MINISTERIAL - HOMOLOGACIÓN DEL ÁREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CIUDAD DE CHALLAPATA

