


GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA



INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS GESTIÓN 2021

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO




**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS**



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



**SUB ALCALDÍA
DISTRITO CHALLAPATA**

ACTIVIDAD: "APOYO A LA PRODUCCIÓN – IMPLEMENTACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA MICRO RIEGO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN RIEGO TECNIFICADO DE ALTURA CHALLAPATA" Y "ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA PARA LOS 7 AYLLUS DEL DISTRITO CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
183.929,68	82.650,15	29 D. C.	11/10/2021	08/11/2021	100.00	99,73
	100.790,00	6 D.C.	16/12/21	20/12/21		



SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA "AZANAQUE"

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO



SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE
PROVEEDOR: H. GARCIA EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS

ACTIVIDAD: "APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNIDAD QUEREZANA ANDAMARCA (ADQUISICION DE SEMILLAS DE ALFALFA)"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
90.000,00	89.969,00	5	3/09/21	3/10/21	100,00	99.97



SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE
EMPRESA EJECUTORA: COBOAGRO S.R.L.


OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

ACTIVIDAD: “ADQ. MATERIALES SIST. DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VILAQUE CHALLAPATA”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA ENTREGA DE MATERIAL	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
40.110,00	39.289,83	35 D. C.	08/12/2021	100,00	97,96



SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
PROVEEDOR ADJUDICADO: MIGUEL ÁNGEL HURTADO FLORES
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE CONVENIO PDA ESPERANZA CONST.
SIST. DE AGUA POTABLE CHALLAPATA”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
1.046.475,00	958.971,93	-	-	-	100,00	91,64

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO MEDIANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS EL DESCARGO CORRESPONDIENTE DE LA CONTRAPARTE DEL MUNICIPIO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

SUPERVISOR DE CIERRE: ING. SIXTO ACHA HUALCA
EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA “DAGESA”

OBSERVACIONES: PROYECTO EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018 MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL G. A. M. CHALLAPATA – VISIÓN MUNDIAL PDA ESPERANZA




GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: CONTRAPARTE CONVENIO AGUATUYA DISEÑO DE INGENIERIA “PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES CHALLAPATA”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
49.141,00	29.484,00	90	13/12/21	12/03/22	80	60,00

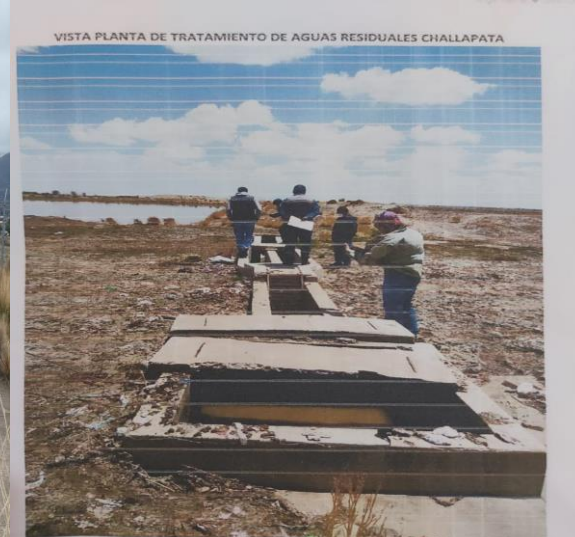

SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE
EMPRESA EJECUTORA: FUNDACION AGUA TUYA

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD EN EJECUCION

PROYECTO: "CONST. SIST. AGUA POTABLE MOROCOYO CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
570.369,00	552.364,00	120 D. C.	27/01/2021	27/05/2021	100,00	96,84



SUPERVISOR FPS: ING. JAVIER WILFREDO AGOSTOPA CHAPARRO
EMPRESA EJECUTORA: GUIHESI CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

ACTIVIDAD: "CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CUTAMASI CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
90.000,00	89.051,62	30 D. C.	11/11/2021	10/12/2021	100,00	98,95



SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
EMPRESA EJECUTORA: G DAZUL CONSTRUCCIONES S. R. L.

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

**ACTIVIDAD: "CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE JUZCA VILAQUE
AGUA CALIENTES CHALLAPATA"**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
277.843,20	251.804,91	91 D. C.	16/11/2021	14/02/2022	91,00	90,63



SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA "EMORCO" S. R. L.

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

ACTIVIDAD: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO COMUNIDAD JANKOIQUE CHALLAPATA (COMPONENTE – OBRAS COMPLEMENTARIAS)”


PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
19.394,81	19.385,04	3	17/11/21	19/11/21	100,00	99.95



SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA UNIPERSONAL “FACORC”

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021




PROYECTO: "MEJORAMIENTO MICRORIEGO COMUNIDAD MALLIRI CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
90.000,00	69.756,56	10	19/12/2021	29/12/2021	100,00	77,51



SUPERVISOR: ARQ. VLADIMIR MIMOR MARCA
EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA "PLASTIFORTE" SRL

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



**ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE PROYECTO DE CONVENIO AMPLIACIÓN
CANAL DE RIEGO COMUNIDAD ALLITUMA SUD CHALLAPATA”**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
9.929,32	0,00	-	-	-	0,00	0,00

EN LA GESTION 2021 NO SE PUDO CONCRETIZAR EL CONVENIO RESPECTIVO CON NINGUNA INSTITUCION PARA LOGRAR LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIONES: LA ACTIVIDAD NO FUE CONCRETIZADA

ACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS SISTEMA NACIONAL DE RIEGOS Nro.2 TACAGUA CHALLAPATA "

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA ENTREGA DE MATERIAL	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
80.000,00	79.815,00	30 D. C.	06/12/2021	100,00	99,77



SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
PROVEEDOR ADJUDICADO: JOSE MAMANI NINA
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



PROYECTO: "CONTRAPARTE ELECTRIFICACIÓN PROVINCIA AVAROA FASE II"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
849.344,46	816.525,64	561 Dias calendarios	03/06/2020	16/12/2021	100,00	96,14

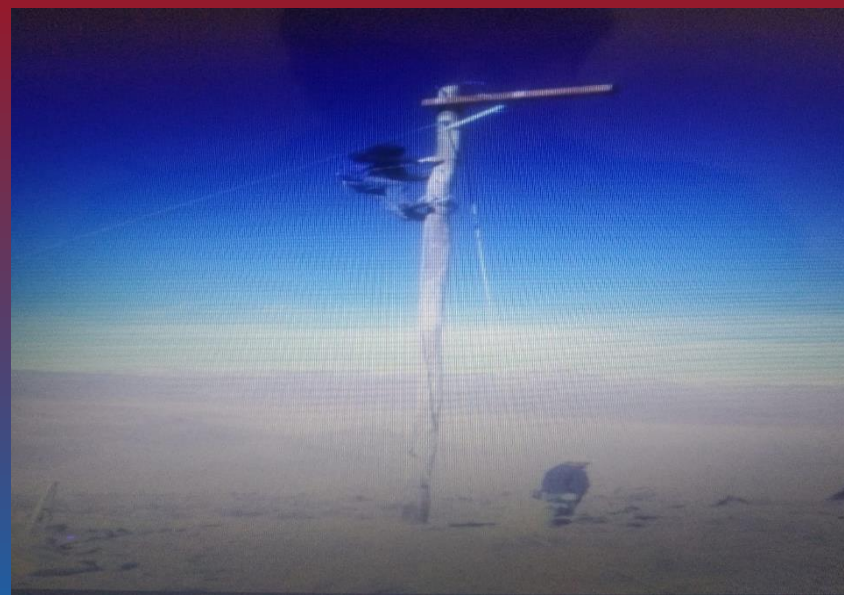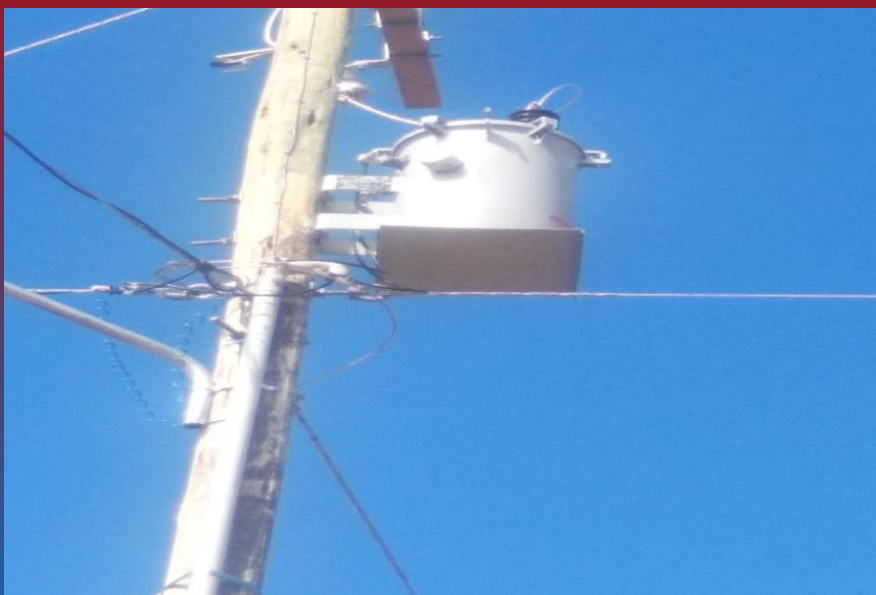

SUPERVISOR: GOBERNACIÓN DE ORURO
PROVEDOR ADJUDICADO: "EMISEC"
EL PROYECTO SE REALIZO AL 100%

OBSERVACIONES: Falta cancelación de la contraparte por parte del municipio

ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
90.000,00	90.000,00	10	07/11/2021	17/11/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: Eddy Abraham Mendoza Mallico

PROVEDOR ADJUDICADO: Sr. Freddy Edgar Quiroz Aguirre

El cual se realizo el mejoramiento en las calles ortega/Cochabamba/oruro

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA


PROYECTO: “ADQUISICION DE MATERIALES ENLOSETADO C/LOPEZ T. PEREZ Y BENI CHALLAPATA”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
95.000,00	86.876,00	18	2/12/2021	20/12/2021	100,00	91,45



SUPERVISOR: ARQ. VLADIMIR MIMOR MARCA
EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “FACORC”

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO




GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021




PROYECTO: “CONST. PRADO AV. L. CABRERA ENTRE CBBA Y 9 DE ABRIL CHALLAPATA”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
555.068,30	555.068,30	220 D. C.	24/12/2019	30/10/2020	100,00	100,00

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO EL PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA QUE SE ADEUDABA A LA EMPRESA CONTRATISTA POR MOTIVOS DE LA ILIQUIDEZ FINANCIERA QUE SE SUSCITO EN LA GESTION 2020 A CAUSA DE LA PANDEMIA MUNDIAL OCURRIDA EN TODA NUESTRO PLANETA

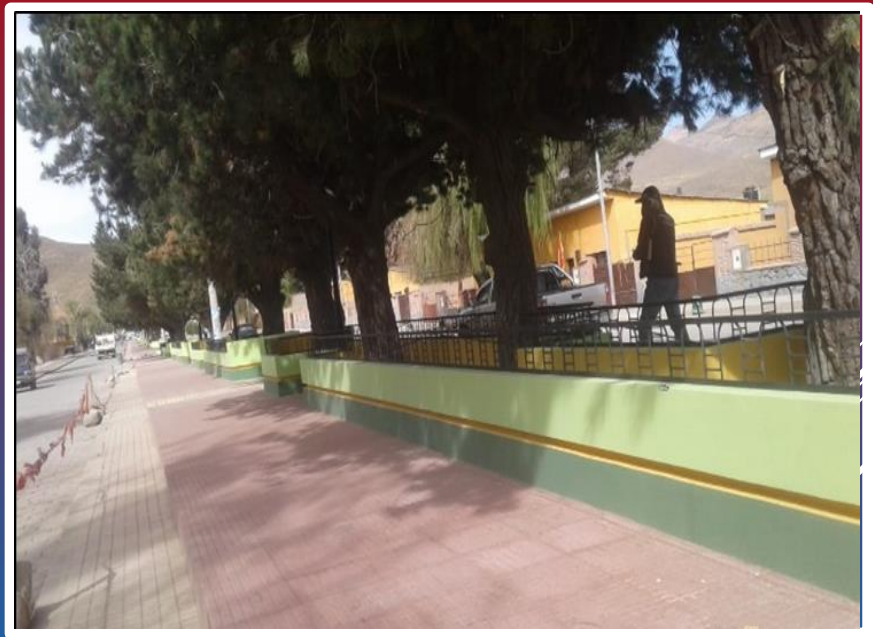

FISCAL DE OBRA: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
EMPRESA EJECUTORA: CONSULTORA CONSTRUCTORA “ELYON”
OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO EN LA GESTIÓN 2020



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



**ACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL COMUNIDAD
MACALLU CHALLAPATA"**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
87.091,04	87.091,04	27 D. C.	20/11/2020	16/12/2020	100,00	100,00


EN LA GESTION 2021 SE REALIZO EL PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA QUE SE ADEUDABA A LA EMPRESA CONTRATISTA POR MOTIVOS DE LA ILIQUIDEZ FINANCIERA QUE SE SUSCITO EN LA GESTION 2020 A CAUSA DE LA PANDEMIA MUNDIAL OCURRIDA EN TODA NUESTRO PLANETA



SUPERVISOR DE OBRA: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA "IVA - RU"

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO EN LA GESTIÓN 2020



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: “AMPLIACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN C. S. SUMAJ CAUSAYPAC CHALLAPATA (MANO DE OBRA)”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
94.700,33	94.700,33	35 D. C.	03/11/2020	07/12/2020	100,00	100,00

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO EL PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA QUE SE ADEUDABA A LA EMPRESA CONTRATISTA POR MOTIVOS DE LA ILIQUIDEZ FINANCIERA QUE SE SUSCITO EN LA GESTION 2020 A CAUSA DE LA PANDEMIA MUNDIAL OCURRIDA EN TODA NUESTRO PLANETA



SUPERVISOR DE OBRA: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: CONSULTORA CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS "YAHVE NISI"

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO EN LA GESTIÓN 2020

**PROYECTO: "CONST. CENTRO DE SALUD VILLA EL CARMEN
CHALLAPATA"**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
330.000,00	231.776,28	92	14/12/2021	15/03/2022	83,00	70,24



SUPERVISOR: ARQ. VLADIMIR MIMOR MARCA
EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA "ZEVOCROPIA"


OBSERVACIONES: PROYECTO A CULMINAR

ACTIVIDAD: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES MURO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
40.000,00	36.484,00	5 D.C.	16/12/2021	20/12/2021	100,00	91,21



SUPERVISOR: ING. DEYSI CANAVIRI HUANCA
PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL HURTADO FLORES
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



**ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE CONVENIO PDA ESPERANZA
AMPLIACIÓN DE TALLER U. E. NACIONAL ANTOFAGASTA CHALLAPATA”**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
8.873,00	0,00	-	-	-	100,00	0,00

EN LA GESTION 2021 NO SE PUDO REALIZAR MEDIANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS EL DESCARGO CORRESPONDIENTE DE LA CONTRAPARTE DEL MUNICIPIO POR MOTIVOS QUE NO SE TIENE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE ESTOS DESCARGOS

OBSERVACIONES: PROYECTO EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018 FALTA REALIZAR LOS DESCARGOS CORRESPONDIENTES PARA SU RESPECTIVO CIERRE ADMINISTRATIVO

**ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO U.E. DISTRITO CHALLAPATA
(ADQUISICION DE MATERIALES - MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO
EN UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CHALLAPATA)"**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA ENTREGA DE MATERIAL	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
40.000,00	37.113,00	20 D. C.	27/04/2021	100,00	92,78



SUPERVISOR: MARCELO CHOQUE VARGAS
PROVEEDOR: TOOLBOX TRADE

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA


ACTIVIDAD: "EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO U.E.SANTA ROSA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
60.000,00	59.980,00	25	12/08/21	10/09/21	100,00	99,97



SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QISPE QISPE
EMPRESA EJECUTORA: LABO TIENDA AKAPANA

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA



PROYECTO: "CONST. UNIDAD EDUCATIVA GRAL. JOSE BALLIVIAN Y SEGUROLA - CHALLAPATA"


PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
354.430,46	354.430,46	348 D. C.	01/04/2019	13/03/2020	100,00	100,00

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO EL PAGO DE LA ULTIMA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA QUE SE ADEUDABA A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE ESTE PROYECTO.



SUPERVISOR DE OBRA: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
 EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA 'EDEN S. R. L.'

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO EN LA GESTIÓN 2020



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



PROYECTO: "CONST. DE 5 AULAS U.E. ANTOFAGASTA NIVEL PRIMARIO CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
500.000,00	387.885,14	88	7/11/2021	5/02/2022	100,00	77,58



SUPERVISOR: FISCAL. VLADIMIR MIMOR MARCA
EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA "FREPANIL"

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

**ACTIVIDAD: "PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE POLITICAS SOCIALES
POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
90.000,00	90.000,00	360	01/01/2021	31/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: LIC. MARIBEL S. AGUILAR CHACA


OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

ACTIVIDAD: "PREVENCIÓN DESASTRES NATURALES DISTRITO CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
20.000,00	19.962,00	10 D.C.	07/12/2021	100,00	99,81



SUPERVISOR: ING. JOSE ARANCIBIA BAPTISTA
EMPRESA EJECUTORA: DAVID CHUNGARA QUISPE
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA



ACTIVIDAD: "CONTRAPARTE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA AZANAQUE"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
220.573,70	0,00	-	-	-	0,00	0,00


LA ACTIVIDAD NO FUE CONCRETIZADA EN LA ANTERIOR GESTION A RAZON DE QUE NO SE PUDO REALIZAR LA FIRMA DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EN G. A. M. CHALLAPATA, G. A. D. ORURO, Y VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA POR MOTIVOS QUE LAS DEMAS INSTITUCIONES NO CONTABAN CON LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO POR LO CUAL LA ACTIVIDAD QUEDO POSTERGADA PARA ESTA GESTION 2022

RESPONSABLE: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD POSTERGADA PARA LA GESTIÓN 2022

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
1.325.630,00	1.162.769,75	365	01/01/2021	31/12/2021	87.40	87.71

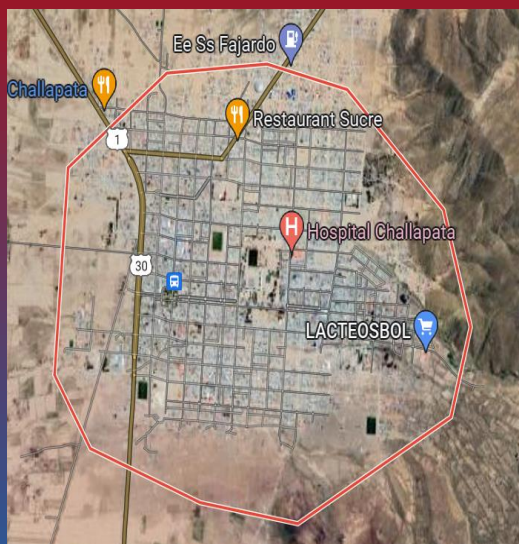

- HABERES DE PERSONAL SUB ALCALDIA
- ENERGIA ELECTRICA
- MANTENIMIENTO CAMINOS
- LEVANTAMIENTO GEODESICO DE PUNTOS CHALLAPATA



RESPONSABLE: FRANCISCA CHECO C.

PROVEEDOR: MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHALLAPATA TENDIDO DE RED SECUNDARIA DE GAS – NUEVO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL CHALLAPATA (MANO DE OBRA)"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
45.649,24	45.649,24	12 D. C.	02/12/2021	13/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA "FACORC"
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

CONVENIO INTERGUBERNATIVO: "PERFORACIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO CHALLAPATA"

ESTRUCTURA FINANCIERA DE CONTRAPARTES (Bs)		PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DÍAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
MUNICIPIO	GOBERNACIÓN						
45.433,80	145.048,80	190.482,26	28 D.C.	06/12/2021	31/12/2021	100,00	100,00
23,85%	76,15%						



SUPERVISOR: ING. DEYSI CANAVIRI HUANCA
ENTE EJECUTORA: POR (UNASBVI) DEPENDIENTE DE GOBERNACIÓN.
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

ACTIVIDAD: "IMPLEMENTACIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL U. E. JOSÉ BALLIVIAN Y SEGUROLA CHALLAPATA (MANO DE OBRA)"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
10.000,00	10.000,00	10 D.C.	20/12/2021	29/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ING. DEYSI CANAVIRI HUANCA
EMPRESA CONSTRUCTORA: FIDEL CHUNGARA BEJARANO
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHALLAPATA – APOYO A LA PRODUCCIÓN ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE CEBADA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA ENTREGA DE MATERIAL	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
47.490,50	47.490,50	5 D. C.	15/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS
PROVEEDOR ADJUDICADO: CONTRERAS CALLE CINTIA SUSANA
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHALLAPATA – APOYO A LA PRODUCCIÓN ADQUISICIÓN DE CARRETILLAS CHALLAPATA"



PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
50.000,00	49.920,00	5 D.C.	14/12/2021	20/12/2021	100,00	99,84



SUPERVISOR: ING. DEYSI CANAVIRI HUANCA
PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL HURTADO FLORES
OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

ACTIVIDAD: CONTRAPARTE CONVENIO “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA FASE XI Y FASE XII”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
443.754.00	0.00	249	22/02/2021	31/12/2021	100%	0.00

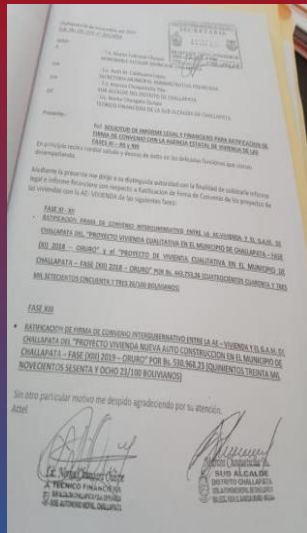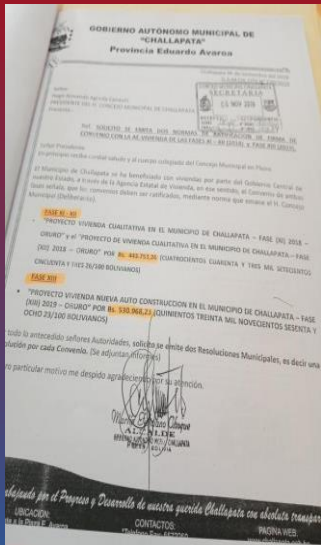

RESPONSABLE: FRANCISCA CHECO C.

PROVEEDOR: MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE, FALTA REALIZAR EL DESEMBOLSO DE LA CONTRAPARTE DE LA SUB ALCALDIA A LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE MOTORIZADOS SUB ALCALDIA CHALLAPATA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
120.000,00	119.733,31	360	01/01/2021	31/12/2021	100%	99.78%



RESPONSABLE: FRANCISCA CHECO C.

PROVEEDOR: MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



**SUB ALCALDIA DISTRITO MARKA
QAQACHACA**



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE CENTRAL QAQACHACA (CHALLAPATA)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
573.120,63	410.788,25	370	28/11/2019	13/11/2020	100,00	71,68



SUPERVISOR: SAUL QUISPE QUECHARI

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA EMCORVI

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO EN CONVENIO ENTRE EL FPS, GAD-ORU Y EL GAMCH.

PROYECTO: CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CHI`TAHUYO
IRUNSATA QAQACHACA

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
145.900,84	145.900,84	80	31 /12/2020	19/03/21	100,00	100,00



SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE
EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA "ELYON"

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

PROYECTO: CONST. SISTEMA DE RIEGO COTAÑA (CHALLAPATA)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
104.101,58	104.101,58	224	24/01/2022	05/09/22	4	100




SUPERVISOR: SIMON RUEDA LOPEZ

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA "LUZ BLANCA"

OBSERVACIONES: PROYECTO EN EJECUCION EN CONVENIO CON MMAyA

**ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES QAQACHACA
(TRAMO CHAKERI)**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
43.091,62	43.091,62	13	24-11-20	06-12-20	100	100

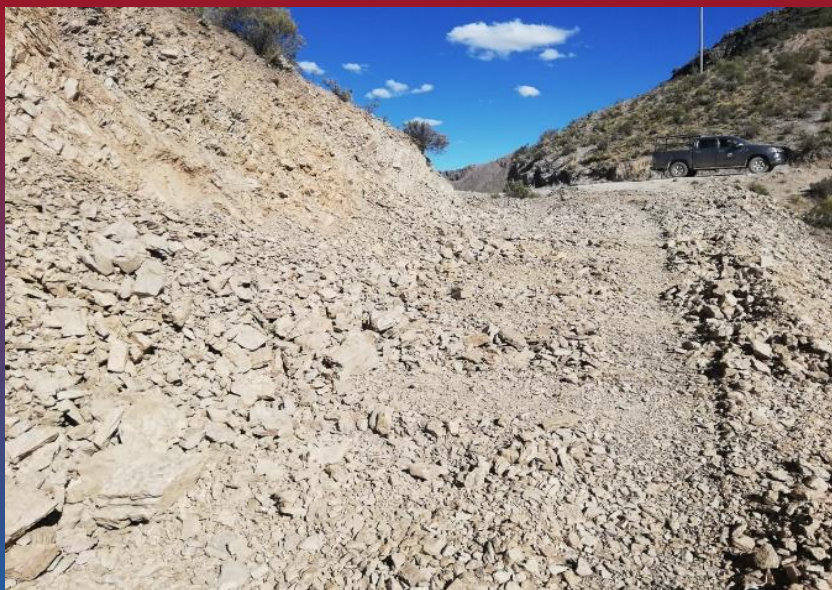

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA "TELFERALCOM S.R.L."

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

**ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES QAQACHACA
(TRAMO IRUNSATA YANAMANI)**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
49.199,16	49.199,16	5	16-12-21	20-12-21	100	100



SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA "SAITAMA S.R.L."

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

**ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES QAQACHACA
(TRAMO JANKO KAWA)**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
46.614,82	46.614,82	5	16-12-21	20-12-21	100	100



SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA "SAITAMA S.R.L."

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINO CR. RT F1 - QAQACHACA -
LIM DEPTAL POTOSI

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
894.112,40	831.523,17	90	20/10/21	17/01/22	100	93



SUPERVISOR: ARQ. TITO UÑO ARIVIRI
EMPRESA EJECUTORA : SEDCAM ORURO
OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



PROYECTO: CONST. PUENTE VEHICULAR TARUT KAWA

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
575.089,77	571.717,17	188	28/10/2019	24/07/2020	100,00	91,41




SUPERVISOR: WALTER MAMANI CONDORI

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA "HUARAYA CONS."

OBSERVACIONES: EL PROYECTO A LA FECHA YA ESTA CONCLUIDO CON ENTREGA PROVISIONAL, ENTREGA DEFINITIVA Y AUDITORIA EXTERNA.

ACTIVIDAD: CONST. PUENTE VEHICULAR JANKO KAWA

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
40.000,00	0.0	45	15/12/2021	28/01/22	100	0.0



SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : CENTRO DE SERVICIOS EN INGENIERIA CESEIN

OBSERVACIONES: PROYECTO DE PREINVERSION CONCLUIDO




GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A SALUD QAQACHACA (CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE GARAJE DE AMBULANCIA C.S. QAQACHACA)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
39,510.95	39,510.95	26	28/10/21	22/11/21	100	100

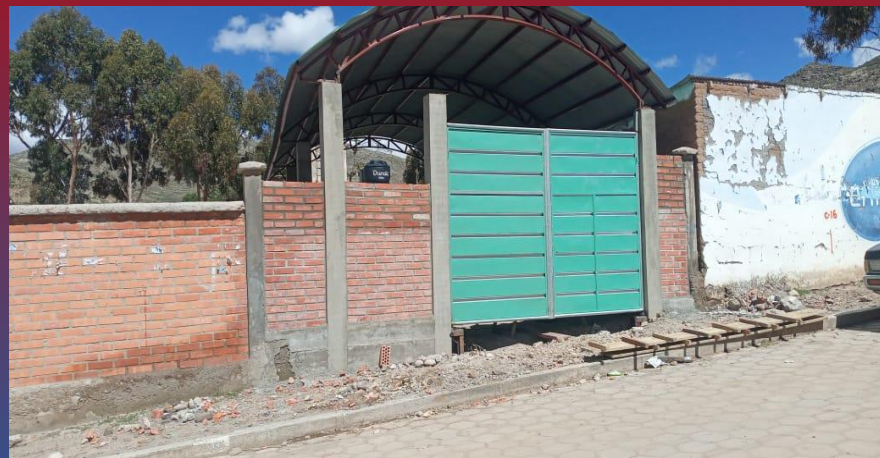

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE
EMPRESA EJECUTORA : SAITAMA SRL

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO




GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A SALUD QAQACHACA (MANTENIMIENTO CENTRO SALUD PARKO)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
20.366,23	20.366,23	33	17-09-20	19-10-20	100	100

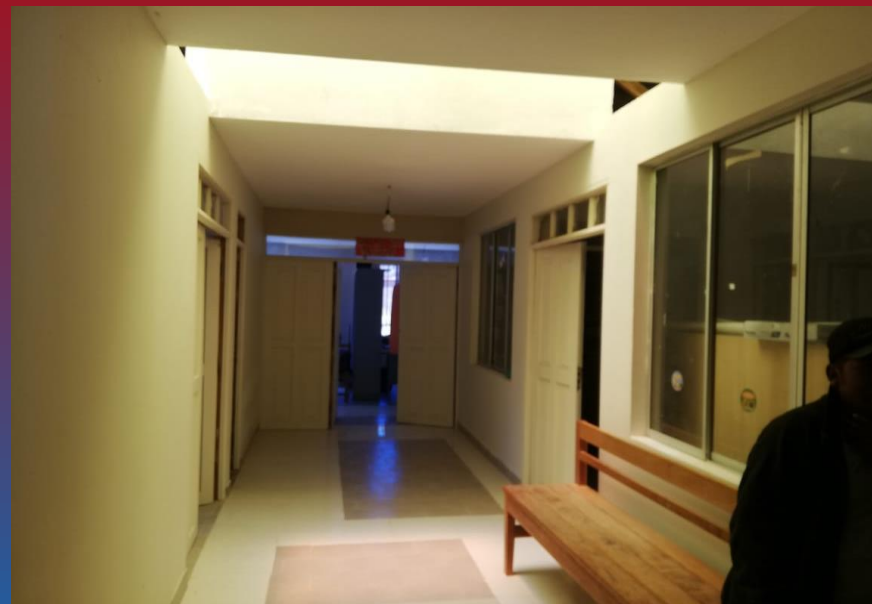

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE
EMPRESA EJECUTORA : SAITAMA SRL

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACION QAQACHACA (ADUICION DE MATERIALES PARA MESON DE LABORATORIO U.E. BARRIENTOS)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
10.867,00	10.867,00	10	21-09-21	28-10-21	100	100



TEC. SEGUIMIENTO: PRIMO ESPEJO COLQUE

FERRETERIA: FERRETERIA CHIRI

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACION QAQACHACA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BATERIA DE BAÑOS CEA WIÑAY QAQACHACA)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
14.915,50	14.915,50	33	11-10-21	12-11-21	100	100



SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE
EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA AZANAQUE
OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACION QAQACHACA (ADQUISICIÓN ATOMISADORES Y PUPITRES)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
14.070,00	14.070,00	15	11-08-21	17-08-21	100	100



TEC. DE SEGUIMIENTO: SUSANA QUISPE MAMANI
CONTRATISTA: BARRACA Y MUEBLERIA KELLY VERA

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA QAQACHACA.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
20.587,00	20.587,00	5	27/12/2021	04/01/2021	100	100



TECNICO DE SEGUIMIENTO: SUSANA QUISPE MAMANI
EMPRESA EJECUTORA : (UNASVBI) DASAR JICA

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA QAQACHACA
 (ADQUICISIONES, SERVICIOS, Y OTROS.)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
253.107,26	253.107,26	365	01/11/2021	31/12/2021	100	100



TECNICO DE SEGUIMIENTO: SUSANA QUISPE MAMANI
EMPRESA EJECUTORA : (MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES)
OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO


ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE MOTORIZADOS
QAQACHACA (ADQUISICIONES, SERVICIOS, Y OTROS.)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
40.000.00	39.999,43	365	01/11/2021	31/12/2021	100	100



TECNICO DE SEGUIMIENTO: SUSANA QUISPE MAMANI
EMPRESA EJECUTORA : (MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES)

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



**SUB ALCALDIA DISTRITO INDIGENA
CULTA**

PROYECTO: "MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE KASA VENTILLA CULTA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
19.417,00	19.327,88	06 D/C.	08/10/2021	13/10/2021	100,00	99,54



SUPERVISOR: ING.(e) ALVARO S. MARZE ADRIAN

EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA CONSULTORA "CONWA - CONS"

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

PROYECTO: "CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE ANANOCA (CULTA)"


PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
80.495,00	71.842,50	30 D/C.	27/09/2021	27/10/2021	100,00	89,25



SUPERVISOR: ING.(e) ALVARO S. MARZE ADRIAN

EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA CONSULTORA "CONWA - CONS"

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021




**PROYECTO: CONST. DE ALCANTARILLAS PARA EL CAMINO
VECINAL COMUNIDAD INCUYO - CULTA**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
86.320,00	85.955,72	34 D/C.	07/10/2021	9/11/2021	100,00	99,58



SUPERVISOR: Arq. Ronald Torrez Huallpa
EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA NACIONAL MIJAIL YUCRA

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



PROYECTO: CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL CRUCE CULTA – CHALLAPATA

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
2.018.388,17	2.018.388,17	476 D/C.	11/04/2019	27/10/2020	100,00	100,00



SUPERVISOR: ING. FERNANDO AJHUACHO DOMINGUEZ
EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA CONSULTORA “EDEN S.R.L.”

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

PROYECTO: CONST. PUENTE VEHICULAR CANTUYO CULTA

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
1.195.028,72	934.579,72	303	20/01/2020	17/11/2020	100,00	78,21



SUPERVISOR: WILFREDO CANAVIRI JOANQUINA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA ASOCIACION ACCIDENTAL "INTEGRACION"

OBSERVACIONES: EL PROYECTO A LA FECHA YA ESTA CONCLUIDO CON ENTREGA PROVISIONAL, ENTREGA DEFINITIVA Y AUDITORIA EXTERNA.


ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACION - CULTA

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
39.284,00	31.200.00	20 D/C.	07/11/2021	27/12/2021	100,00	79,42



SUPERVISOR: Arq. Ronald Torrez Huallpa
CARPINTERIA : ELY BAREA

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021




ACTIVIDAD: "CORDONAMIENTO FRONTIS U.E. SIMON BOLIVAR CRUCE CULTA (MANO DE OBRA)"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
24.929,50	24.928,48	34 D/C.	17/12/2020	19/01/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ING.(e) ALVARO S. MARZE ADRIAN
EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA "JONADABET S.R.L."

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



PROYECTO: CONST. DE 2 AULAS U.E. BOLIVIA - CULTA


PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
140.000,00	139.995,13	43 D/C.	11/11/2021	27/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: Arq. Ronald Torrez Huallpa

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA E INGENIERIA MADELGABY

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CULTA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
265.766,88	260.141,30	365 D/C.	01/01/2021	31/12/2021	100,00	97,88



**SUB ALCALDIA
DISTRITO CULTA**

SUPERVISOR: SUB ALCALDE PRUDENCIO CAÑARI

OBSERVACIONES: GASTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CULTA"
(DESGLOSE DE ACTIVIDADES)
GASTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
151.931.50	151.931.50	365 D/C.	01/01/2021	31/12/2021	100,00	97.88

- GASTOS ADMINISTRATIVOS SUB ALCALDIA CULTA.
- PERSONAL DE SERVICIO (3 SERVIDORES PUBLICOS)
- 1 CHOFER VOLQUETA Y CHOFER RETROEXCAVADORA,
- 1 PORTERO SUB ALCALDIA POBLACION CRUCE CULTA
- 1 TECNICO.
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TELEFONIA SUB ALCALDE (TELEFONIA DE CORPORATIVOS)
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAMIONETA SUB ALCALDIA
- COMPRA DE COMBUSTIBLE
- COMPRA DE LLANTAS, ACEITES Y LUBRICANTES (PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES).
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA , RETROEXCAVADORA Y TRACTOR AGRICOLA).
- COMPRA DE COMBUSTIBLE
- COMPRA DE REPUESTOS
- CONTRAPARTE CONVENIO INTERGUBERNATIVO G.A.D.O.R.– G.A.M. CHALLAPATAELECTRIFICACION II FASE PROV. EDUARDO AVAROA



RESPONSABLE : SUB ALCALDE, PRUDENCIO CAÑARI
OBSERVACIONES: ACTIVIDADES CONCLUIDAS

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CULTA"
(DESGLOSE DE ACTIVIDADES)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
28.218,80	28.218,80	15 D/C.	20/12/2021	04/01/2022	100,00	100

- CONTRAPARTE SUB ALCALDIA DISTRITO CULTA - CONVENIO INTERGUBERNATIVO G.A.D.O.R. – UNASBVI – G.A.M. CHALLAPATA (PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL CRUCE CULTA)



SUPERVISOR: ING (e) ALVARO S. MARZE ADRIAN

OBSERVACIONES: ACTIVIDADES CONCLUIDAS

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CULTA"
(ADQUISICION DE ESTACION TOTAL ELECTRONICA)

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
79,991.00	79,991.00	5 D/C.	23/112021	27/12/2021	100,00	100,00



➤ **ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL)**

ENCARGADO: Arq. Ronald Torrez Huallpa
EMPRESA : GEODECIA Y TOPOGRAFIA S.R.L.

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA




**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



**SUB ALCALDIA DISTRITO INDIGENA
NORTE CONDO**



ACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRORIEGO YANAQUE CHANGARA NORTE CONDO"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
104.458,00	104.457,99	43	11/10/2021	22/11/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: JAIME PACOLLA COLQUE

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA "TOMIREY"

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA

PROYECTO: “CONST. PUENTE VEHICULAR CHUCHUNICOLLO”


PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
709.160,59	579.063,85	141	15/10/2019	03/03/2020	100,00	81,65



SUPERVISOR: VALENTIN BRAULIO INO COPA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ANFREDA”

OBSERVACIONES: EL PROYECTO A LA FECHA YA ESTA CONCLUIDO CON ENTREGA PROVISIONAL, ENTREGA DEFINITIVA Y AUDITORIA EXTERNA.




ACTIVIDAD: "APOYO INTERNADO NORTE CONDO"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
43.000,00	41.954,30	298	02/02/2021	31/12/2021	100,00	97.57



- **ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN INTERNADO NORTE CONDO**
- **CONTRATACIÓN DE CONSULTOR EN LÍNEA – PORTERA INTERNADO SEDE NORTE CONDO**

FISCAL DE SERVICIO: JAIME PACOLLA COLQUE
 EMPRESA EJECUTORA: TIENDA COMERCIAL "COLQUE"
 OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA



ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA NORTE CONDO"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
121.314,28	119.929,04	360	01/01/2021	31/12/2021	100,00	98,86



Aniversario Norte Condo servicio de sonido profesional para el acto central



Desparasitación y vitaminización de ganado camélido en Norte Condo



Adquisición de materiales de escritorio



Gastos de combustible, lubricantes mantenimiento de motorizados Sub Alcaldia Norte Condo



Contratación de consultor en línea OPERADOR – CHOFER de maquinaria pesada norte Condo



Contratación de consultor en línea COCINERA – INTERNADO SEDE NORTE CONDO

TECNICO DE SEGUIMIENTO: JAIME PACOLLA COLQUE

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



**SUB ALCALDIA DISTRITO INDIGENA
NORTE CONDO ABAJO**

ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE CONVENIO FPS CONTRUCCION RIEGO TECNIFICADO UMAMIAN (CHALLAPATA)”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
255.027,00	255.027,00	180	26/06/2021	23/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: Ing. SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ ARAMAYO

EMPRESA CONSTRUCTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “ATRALID”

OBSERVACIONES: PROYECTO EN CONVENIO ENTRE EL FPS, GAD – ORU Y EL G.A.M.CH., A LA FECHA CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL.

PROYECTO: "CONST. PUENTE VEHICULAR CUSUMI NORTE CONDO"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
197.358,00	196.702,59	40	21/10/2021	30/11/2021	100,00	99,67



SUPERVISOR: WILDER ALVARO VILLCA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA NACIONAL MIJAIL YUCRA "CONAMY"

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO.



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



SUB ALCALDIA DISTRITO HUANCANE

ACTIVIDAD: “PROMOCIÓN DE FERIA DISTRITO HUANCANÉ”

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
10.000,00	10.000,00	15	20/11/2021	01/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

CONTRATISTA :PROVEEDORA “TONDOLA”

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

ACTIVIDAD: "APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO ROSARIO Y CATARIRI HUANCANE"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
31.134,00	31.134,00	15	20/11/2021	01/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN
CONTRATISTA: PROVEEDORA "COIMBA"

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

ACTIVIDAD: "APOYO A SALUD DISTRITO HUANCANE"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
10.000,00	9.476,00	15	15/08/2021	30/08/2021	100,00	94,76



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

CONTRATISTA :PROVEEDORA "REY"

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

ACTIVIDAD: “APOYO A EDUCACION HUANCANE” COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO U.E. HUANCANE ROSARIO

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
6.060,00	6.060,00	15	15/02/2021	22/04/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN
CONTRATISTA: PROVEEDORA “REY”

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA, SE ENTREGRO IMPRESORAS Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LOS NIÑOS.

ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA HUANCANE
PERFILADO DE CANCHA DE FUTBOL HUANCANE Y COMPRA DE
LLANTAS DE TRACTOR AGRICOLA

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
66.360,80	66.360,80	15	15/08/2021	30/08/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

EJECUTORA : UBRAD E GADOR Y MUNICIPIO

PROVEEDORA "LEIJAM IMP."

OBSERVACIONES: ACTIVIDADES CONCLUIDAS, SE CUMPLIERON LAS CONTRAPARTES Y SE ADQUIRIERON LLANTAS PARA EL TRACTOR AGRICOLA



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



SUB ALCALDIA DISTRITO ANCACATO

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE MICRORIEGO IRUMA
CATARIRI (ANCACATO)"**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
13.558,69	13,558,69	34	24/12/2020	31/01/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

CONTRATISTA: "AZANAQUE"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBSERVACIONES: CONCLUIDO

**PROYECTO: "MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO URMIRI
(ANACATO)"**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
37.991,00	37.739,70	75	28/12/2021	13/03/2022	10,00	99,34



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

PROVEEDORA: "MATZUDA"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

ACTIVIDAD: APOYO A SALUD ANCACATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO C.S. ANCACATO Y P.S. HUANCARANI

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
15.000,00	10.824,43	365	01/03/2021	31/10/2021	72,16	72,16



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

OBSERVACIONES: SE ADQUIRIERON EQUIPAMIENTO PARA P.S. HUACARANI Y SE HACE REFACCIÓN DEL C.S. ANCACATO

ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACIÓN ANCACATO: "ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
15.000,00	14.895,00	365	01/03/2021	31/10/2021	100,00	99,30



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

OBSERVACIONES: SE ADQUIRIERON ALIMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS COMUNIDADES ANCACATO Y HUANCARANI

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA ANCACATO"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
82.077,98	81.891,91	365	01/01/2021	31/12/2021	100%	99,77%



***GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS.**

***GASTOS DE EQUIPAMIENTO DE SUB ALCALDÍA.**

***GASTOS DE COMBUSTIBLE, ENERGÍA , TELEFONÍA Y TODO LO REFERENTE A ESCRITORIO.**

RESPONSABLE: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBSERVACIONES: SE ADQUIRIERON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RIEGO, ASI TAMBIEN COMO GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB ALCALDIA


FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA ANCACATO: "AQUISICIONES DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS: AGUA POTABLE Y RIEGOS COMUNIDADES ANCACATO, HUACHACALLA, COSMINE, PATACUYO"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
46.615,05	46.615,05	150	03/07/2021	31/12/2021	100,00	100,00



SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBSERVACIONES: SE ADQUIRIERON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RIEGO, COMO TAMBIEN LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS COMUNIDADES



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**



**SUB ALCALDIA DISTRITO INDIGENA
CRUCE AGUAS CALIENTES**

ACTIVIDAD: "APOYO A SALUD CRUCE AGUAS CALIENTES"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
10.000,00	9.761,89	365	01/01/2021	31/12/2021	100,00	97,62




Adquisición De Una Computadora Para El Puesto De Salud Antacollo Del D.I. Cruce Aguas Calientes. **Monto de la Actividad: 6.050,00 Bs. PROVEEDOR: "DIC-BOL"**

Adquisición De Equipamiento Para El Cuarto Del Interno Y Personal De Salud Del Puesto De Salud Antacollo del Distrito Cruce Aguas Calientes . **Monto de la Actividad: 1.150,00 Bs. PROVEEDOR: "ROSE MEDICAL S.R.L."**



Adquisición De Equipamiento Para El Cuarto Del Interno Y Personal De Salud Del Puesto De Salud Antacollo Del Distrito Cruce Aguas Calientes. **Monto de la Actividad: 1.800,00Bs. PROVEEDOR: "PABLO ALVARADO AYAMAYA"**

ACTIVIDAD:
"APOYO A LA SALUD TOLAPALCA"



Cargado de Combustible para la ambulancia del Puesto de Salud Antacollo del D.I. Cruce Aguas Calientes. **Monto de la Actividad: 761,89 Bs.**

ACTIVIDAD: "APOYO A EDUCACION AGUAS CALIENTES"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
10.000,00	9.923,60	365	01/01/2021	31/12/2021	100,00	99,24

Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento de las Unidades Educativas. **Monto de la Actividad: 9.451,60 Bs. PROVEEDOR: "COMERCIAL Y FERRETERIA FELCOMAN; VIKMAR"**



ACTIVIDAD:
"APOYO A
EDUCACION
AGUAS
CALIENTES "

Compra De Insumos de Bioseguridad para las Unidades Educativas D.I. Cruce Aguas Calientes. **Monto de la Actividad: 472,00 Bs.**

ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CRUCE AGUAS CALIENTES"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
73.839,00	73.759,42	365	01/01/2021	31/12/2021	100,00	99,89

Adquisición De Llantas Para La Camioneta De La Sub Alcaldía. **Monto de la Actividad: 4.260,00 Bs. PROVEEDOR: RAMIRO QUELCA QUISPE**

Adquisición De Computadora De Escritorio Para La Continuidad De Trabajo Técnico En La Sub Alcaldía De Cruce Aguas Calientes. **Monto de la Actividad: 7.600,00 Bs. PROVEEDOR: CAROLINA ARAMAYO TANGARA**

Adquisición De Materiales Para Obras Complementarias Al Sistema De Microriego Uyuni Cruce Aguas Calientes . **Monto de la Actividad: 6.400,00 Bs. PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL HURTADO FLORES**

Material De Escritorio Para La Gestion 2021 D.I.C. Aguas Calientes. **Monto de la Actividad: 13.494,00 Bs. PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL HURTADO FLORES**

ACTIVIDAD:
"FORTALECIMIENTO
SUB ALCALDIA
TOLAPALCA"



Mantenimiento Camino Vecinal Chiritambo Cruce Aguas Calientes . **Monto de la Actividad: 24.051,63 Bs. EMPRESA: EMPRESA CONSTRUCTORA "IVA-RU"**



- Suministro de Combustible para la camioneta de la Sub Alcaldia *LUBRICANTES *ACEITE *RODAMIENTO. **Monto de la Actividad: 16.302,19 Bs.**
- Corporativo telefonía de la Sub Alcaldesa . **Monto de la Actividad: 1.651,60 Bs.**



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE CHALLAPATA**

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

**INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021**




**SUB ALCALDIA DISTRITO INDIGENA
TOLAPALCA**

ACTIVIDAD: "APOYO A LA SALUD TOLAPALCA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
5.000,00	4.996,40	365	01/01/2021	31/12/2021	100,00	99,93

Adquisición de Materiales para Refacción del Sistema De Agua Potable de la Posta De Salud. **Monto de la Actividad: 340,40 Bs**

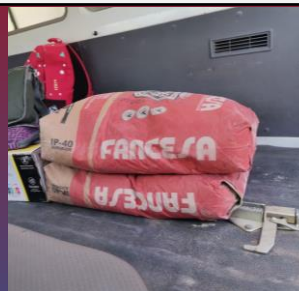

Adquisición de Materiales de Construcción para Mejoramiento del Centro de Salud Tolapalca. **Monto de la Actividad: 4.656,00 Bs**



ACTIVIDAD:
"APOYO A LA SALUD
TOLAPALCA"

SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA
PROVEEDOR: "VIKMAR"

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

ACTIVIDAD: "APOYO A LA EDUCACION TOLAPALCA - BUS TRANSPORTE ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA TOLAPALCA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
20.000,00	19.997,93	80	02/08/2021	18/11/2021	100,00	99,99




SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA

PROVEEDOR: "Roman Cruz Rivera"

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO
GESTION 2021



ACTIVIDAD: "FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA TOLAPALCA"

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs)	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA CONCLUSION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)
38.443,00	38.441,76	365	01/01/2021	31/12/2021	100,00	100,00

Compra De Materiales para Acometida de Energía Eléctrica - Instalación de Medidor a la Sede el Distrito Indígena Tolapalca. **Monto de la Actividad: 761,50 Bs.**
PROVEEDOR: COMERCIAL Y FERRETERIA FREMY EL SALVADOR



Adquisición de Materiales de Construcción para la Ampliación del Sistema de Agua Potable Carimayo. **Monto de la Actividad: 2.843,90 Bs.**
PROVEEDOR: VIKMAR



ACTIVIDAD:
"FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA TOLAPALCA"

- MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA SUB ALCALDIA DEL DISTRITO INDIGENA TOLAPALCA. **Monto de la Actividad: 7.477,00 Bs.**
- Adquisición de Materiales de Construcción para Mejoramiento del Centro de Salud Tolapalca. **Monto de la Actividad: 1.925,60 Bs.**
- Adquisición de Insumos de Bioseguridad e Implementos de Bioseguridad para reducir el Riesgo de Contagio del COVID-19 en la U.E.Tolapalca. **Monto de la Actividad: 3.382,00 Bs**
- Adquisición de Equipos Tecnológicos (Computadora Portatil, Impresora Multifuncional y Proyector) para la Sub Alcaldía D.I. Tolapalca **Monto de la Actividad: 17.350,00 Bs.**
- ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS DE DESPARACITACION CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN D.I. TOLAPALCA. **Monto de la Actividad: 2.553,00 Bs.**
- COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA (TRASLADO DE TARIMA PARA ANIVERSARIO). **Monto de la Actividad: 400,00 Bs.**
- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUB ALCALDIA D.I. TOLAPALCA (telefonía). **Monto de la Actividad: 1.748,76 Bs.**

SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO
